Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e.V.

Quickborner Str. 12, 13158 Berlin, info@gartenfreunde-pankow.de

Wertermittlung bei Unterpächterwechsel

Name des Unterpächters: Erika Musterfrau
Kleingartenanlage: KGA Testgarten
Parzelle / Weg: 42 / Rosenweg
Vorgangs-Nr.: **2026-103**
Wertermittlung am: 14.10.2026

Anwesend waren: Wertermittler Bau: Bert Bauer
Wertermittler Außenanlagen und Aufwuchs:
für den Unterpächter: Erika Musterfrau
für den Auftraggeber: Max Mustermann
für den Verein: Hans Vorstand

Bewertung

Baulichkeiten lt. Anlage 1	**12.354,01 €**	(einschließlich Abwasseranlage)
Außenanlagen lt. Anlage 2	**0,00 €**	
Aufwuchs lt. Anlage 3	**0,00 €**	
Zwischensumme	**12.354,01 €**	
Kosten nicht beräumter Baulichkeiten	**400,00 €**	
Beseitigungskosten Bau lt. Anlage 4	**2.400,00 €**	
Beseitigungskosten AA & Aufwuchs lt. Anlage 4	**0,00 €**	
Gesamtbetrag mit Abzügen	**9.554,01 €**	

Die Wertermittlung erfolgt auf der Grundlage der "Wertermittlungsrichtlinie für Kleingärten" des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V.

Erklärung: Die Wertermittler haften nicht für versteckte Mängel.
Versteckte Mängel im Sinne dieses Protokolls sind Mängel an Baulichkeiten und baulichen Anlagen, die vom Wertermittler nicht eingesehen werden konnten. Dabei ist es unwichtig, ob die Einsichtbarkeit wegen Wandverkleidungen innen und/oder außen (mit oder ohne Baugenehmigung), dichtem Pflanzenwuchs, eingebautem Mobiliar oder sonstigen Gegenständen behindert wurde.

Dieses Protokoll ist das Ergebnis einer Momentaufnahme von Daten zum Zeitpunkt der Wertermittlung auf der Parzelle. Es ist rechtlich nicht mit einem Gutachten gleichzusetzen. Widersprüche wegen nicht korrekter Aufnahme von Daten sind innerhalb 14 Tage direkt an die Wertermittler in schriftlicher Form zu richten. Ein Rechtsanspruch auf Änderung des Protokolls besteht nicht, wenn zum Zeitpunkt der Wertermittlung nicht alle Dokumente zur Ermittlung der Rechtmäßigkeit der Errichtung von Baulichkeiten und Außenanlagen vorgelegt wurden. Besteht trotzdem der dringende Wunsch des abgebenden Unterpächters das Protokoll nachträglich zu ändern, z.B. wegen nachträglicher Einreichung von Nachweisen, können Kosten entstehen.

Änderungen der Bewertung durch nachträgliche Prüfung der Vertragslage sind nicht Bestandteil dieses Protokolls und bedürfen einer zusätzlichen Dokumentation.

Der neue Unterpächter muss das Inventar nicht übernehmen, es muss dann vom scheidenden Unterpächter entfernt werden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die durch die Wertermittler ermittelten Beträge erst bei Neuverpachtung zur Zahlung fällig werden (siehe § 9 Abs. 7 des Unterpachtvertrages).

Ein etwaiger Widerspruch gegen diese Wertermittlung ist innerhalb von 14 Tagen schriftlich an den Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e.V. zu richten.

Kontakt: wertermittlung@gartenfreunde-pankow.de

Datum: _____ Unterschrift BV

„Sachlich und rechnerisch geprüft “

Anlag

Kleingartenanlage: **KGA Testgarten** **Parzelle:** **42**
Parzellenfläche lt. Vertrag: **380 m²** **Rosenweg**
Name des Unterpächters: **Erika Musterfrau**

Der Berechnung zugrunde gelegter Baupreisindex (2015 = 100): **179,2** **für 2026**

Hinweise: **BT** = Bauteil
NHK/m² = Normalherstellungskosten pro m²
Altersabzug =Alterswertr

1. Laube

BT: L Bauklasse: III.1 Doppelt Holz 10,01 - 14,99 cm
Baujahr: 1998 Restnutzungsjahre: 31

NHK/m²:	420,00 €	abzüglich	13	%	Mängelabzug =	365,40 €/m²
	365,40 €/m²	abzüglich	38,4	%	Altersabzug =	225,09 €/m²
	225,09 €/m²	x	1,792	(1/100 Baupreisindex) =		403,36 €/m²

20 m² *) X 403,36 € = 8.067,20 € **Wert BT L** 8.067,20 €
*) zulässig überbaute Fläche (siehe Massenberechnung)

BT: L nicht berechnete Baufläche m²

BT: A1 Bauklasse: IV.2 Doppelwand 4,01 - 8,00 cm
Baujahr: 2005 Restnutzungsjahre: 18

NHK/m²:	325,00 €	abzüglich	3	%	Mängelabzug =	315,25 €/m²
	315,25 €/m²	abzüglich	45,6	%	Altersabzug =	171,50 €/m²
	171,50 €/m²	x	1,792	(1/100 Baupreisindex) =		307,33 €/m²

4 m² *) X 307,33 € = 1.229,32 € **Wert BT A1** 1.229,32 €
*) zulässig überbaute Fläche (siehe Massenberechnung)

BT: A1 nicht berechnete Baufläche, Laube > als 24,0 m² 1,00 m²

BT: A2 Bauklasse: 0 fehlt
Baujahr: Restnutzungsjahre:

NHK/m²:	0,00 €	abzüglich		%	Mängelabzug =	0,00 €/m²
	0,00 €/m²	abzüglich	0	%	Altersabzug =	0,00 €/m²
	0,00 €/m²	x	1,792	(1/100 Baupreisindex) =		0,00 €/m²

m² *) X - € = - € **Wert BT A2** - €
*) zulässig überbaute Fläche (siehe Massenberechnung)

BT: A2 nicht berechnete Baufläche m²
nicht berechnete Bauflächen von BT: 1,00 m²

2. Sonstige bauliche Anlagen (Gewächshaus, separatstehende Baulichkeiten und offener Laubenvorplatz)

2.1.Gewächshaus **BT: GWH** Altersminderung/Jahr: 5 % Alter ca.: 9 Jahre

NHK/m²	160,00 €	abzüglich	10%	Mängel	=	144,00 €
144,00 €	abzüglich	45	% Altersabzug		5	79,20 €
79,20 €	x	1,792	(1/100 Baupreisindex)		=	141,93 €

zulässig 8 m² x 141,93 € = **Wert BT GWH** 1.135,44 €

2.2. zul. einzelne Schuppen u.ä.

BT: S Bauklasse: IV.1 Doppelwand bis 4,00 cm
Baujahr: 2010 Restnutzungsjahre: 12

NHK/m²:	265,00 €	abzüglich		%	Mängelabzug =	265,00 €/m²
	265,00 €/m²	abzüglich	64,2	%	Altersabzug =	94,87 €/m²
	94,87 €/m²	x	1,792	(1/100 Baup		170,01 €/m²

5 m² *) X 170,01 €/m² = 850,05 € **Wert BT S** 850,05 €
*) zulässig überbaute Fläche (siehe Massenberechnung)

Zwischensumme **11.282,01 €**

Anlage

Kleingartenanlage: **KGA Testgarten** **Parz.Nr.:** **42**

Parzellenfläche lt. Vertrag: **380 m²**

Name des Unterpächters: **Erika Musterfrau**

Übertrag: **11.282,01 €**

2.3. Überdachter Laubenvorplatz **BT:** **Ü1**

a) integriert NHK/m² - € abzüglich 0 % Mängel = - €

- € abzüglich 0 % Altersabzug wie Laube = - €

b) angebaut Altersminderung pro Jahr: % Alter ca.: 0 Jahre

Güte: ohne NHK/m² abzüglich 0% Mängel = - €

- € abzüglich 100 Altersabzug = - €

- € 1,792 (1/100 Baupreisindex) = - €

zulässig 0 m² x - € = **- €**

3. Abwasser

3.1. **Abwassersammelgrube** **Genehmigung vom** 01.05.2000 ggf.Nr: G-17

Alter 16 ( ) Jahre alt Grundwert 470,00 € /m³

./. 48 % Altersabzug (3%/Jahr) = 244,40 € /m³ x 5,0 m³ = **1.222,00 €**

Dichtheitsgutachten vom 02.03.2026

Abzug wegen nicht geleerter Abwassergrube **- 150,00 €**

3.2. **Abwasserkanal** erstellt Alter: Jahre

Kosten höchstens - € abzüglich 0% (3%/Jahr) = **- €**

Baulichkeiten insgesamt: **12.354,01 €**

4. **Baubeschreibung**

Laube in Holzständerbauweise, Satteldach mit Bitumenschindeln. Der Anbau (Süd) ist als Abstellraum genutzt. Schuppen aus Blech, standsicher.
Der Zustand ist altersgemäß, kleinere Mängel am Dach.

5. **Bewertete bebaute Fläche** 29,00m² **m²**

6. **Abzüge wegen nicht beräumter Baulichkeiten**

m³	Preis	Summe
4,00	100,00 €	**400,00 €**

7. **Nicht geleerte Abwassersammelgrube** **150,00 €**

Berlin, den 20.10.2026 Wertermittler: Bert Bauer

Kleingartenanlage: KGA Testgarten **Parzelle: 42**

Laube **Rosenweg**

Mängeltabelle für Ermittlung der Normalherstellungskosten				Abzug maximal	Abzug konkret
Bauteil		**Mangel**			
Dach	☐	Sparren - Abstand nicht fachgerecht, größer	als 60-80 cm	20%	8
	☐	Sparren - Risse durch Belastung	☐ Dach nicht horizentral		
	☐	Regenrinne oder Fallrohr nicht fachgerecht	☐ Dachoberfläche beschädigt		
	☐	Fallrohr ohne Ableitung von der Laube	☐ keine Traufkante		
	☐	Dachoberfläche nicht fachgerecht	☐ Dachfenster/Dachluke fehlerhaft		
	☐	Ortgang fehlerhaft oder fehlt	☐ Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion		
	☐	muffiger Geruch unter dem Dach	☐ *unzulässige Höhe der Laube*		
	☐	Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion	☐		
Decken	☐	Decke hängt durch	☐ Feuchtigkeitsflecken	10%	
	☐	loser Putz/Hohlstellen	☐ Verkleidung defekt		
	☐	Anstrich	☐		
Wände	☐	Rohbaumauerwerk	☐ Hohlstellen im Putz	13%	5
	☐	Risse	☐ defekte Verkleidung		
	☐	Feuchtigkeitsflecken	☐ Horizontalsperre defekt		
	☐	Wände nicht lotgerecht	☐ keine fachgerechte Ausführung		
	☐	offene Fugen	☐		
Fußboden	☐	Hohlstellen im Estrich	☐ Risse	10%	
	☐	Dielung gibt nach	☐ Fußboden nicht waagerecht		
	☐	Feuchtigkeitsflecken	☐		
Fundament	☐	Fundamenttiefe nicht erkennbar	☐ Setzungen	20%	
	☐	Kein Spritzwassersockel (mindestens 25 cm)	☐ Brüche		
	☐	Spritzwassersockel fehlerhaft	☐ nicht maßgrecht		
	☐	keine fachgerechte Ausführung (Festigkeit)	☐		
Ausbau außen	☐	Anstrich fehlerhaft	☐ Verkleidung fehlerhaft	**5%**	
	☐	Regenrinne fehlerhaft	☐ Fallrohr fehlerhaft		
Ausbau innen	☐	Rückflussverhinderer fehlt	☐	**7%**	
	☐	Anstrich, Tapeten, Verkleidung fehlerhaft	☐ Fußbodenbelag fehlerhaft		
	☐	Treppen, Leitern fehlerhaft	☐		
	☐	Wasseranschluß fehlerhaft bei vorhandener	Abwassersammelanlage		
Bauelemente	☐	Fenster - Gladichtung fehlerhaft (Kitt)	☐ Fenster - Anstrich defekt	5%	
	☐	Fenster klemmt	☐ Fenster undicht		
	☐	Fensterläden nich ordnungsgemäß	☐ Fensterläden - Anstrich defekt		
	☐	Tür für Außenbereich ungeeignet	☐ Tür klemmt		
	☐	Tür unddicht	☐ Tür - Anstrich defekt		
	☐	Einbruchsschäden	☐		
Schädlinge	☐	Schimmel	☐ Marder, Ratten usw.	10%	
	☐	Hausschwamm	☐ Taubenkot		
Sonderabfall	☐	Asbest	☐ Dachpappe	10%	
Laube nicht beräumt	☐			10%	
Baulichkeiten nicht fertiggestellt: Sie werden zunächst nach dem Stand des Ausbaus bewertet. Es können Abschläge für Mängel kalkuliert werden (z.B. Witterungseinflüsse), die konkret zu benennen sind. ☐				Je nach Zustand	

Nicht ausgewiesene Mängel sind dem Bauteil der Anlage zuzuordnen.

Gesamtabzug % **13**

Anlage 4 (Blatt 1) – Beseitigungskosten Bau/Außenanlagen

Kleingartenanlage: **KGA Testgarten** **Parzelle/Weg:**

Name Unterpächter: **Erika Musterfrau** **42 / Rosenweg**

Beseitigungskosten für nicht gestattete bauliche Anlagen oder nicht gestattete Bepflanzungen / Außenanlagen (einschließlich Folgekosten)

1. Zu entfernende Aufbauten laut Skizze Bau

	Bauteil/Gegenstand	Menge	ME	Einzelpreis	Faktor	Summe
1.	**Einbehalt für Fäkalienabfuhr, wenn Grube bei der WE nicht geleert ist**	1	pauschal	150,00 €	100%	**150,00 €**
	Letzte Abfuhrbescheinigung vom				100%	0,00 €
2.	Rückbau Anbau1 s. - Skizze Bau	12,5	m³	120,00 €	150%	2.250,00 €
3.					100%	0,00 €
4.					100%	0,00 €
5.					100%	0,00 €
6.					100%	0,00 €
7.					100%	0,00 €
8.					100%	0,00 €
9.					100%	0,00 €
10.					100%	0,00 €
11.					100%	0,00 €
12.			**Summe:**			**2.400,00 €**

Begründung wenn Faktor über 100 %	Rückbau Anbau1 s. - Skizze Bau: lange Wegstrecke

2. Zu entfernene Außenanlagen laut Skizze Außenanlagen-Aufwuchs

		Menge	ME	Einzelpreis	Faktor	Summe
1.		1			100%	- €
2.					100%	- €
3.					100%	- €
4.					100%	- €
5.					100%	- €
6.					100%	- €
7.					100%	- €
8.					100%	- €
9.					100%	- €
9.					100%	- €
10.					100%	- €
	Summe:					**- €**

In der Zeit vom 1.März bis 30.Sepzember eines jeden Jahres dürfen aus Gründen des Naturschutzes, insbesondere des Vogelschutzes, keine Bäume sowie Gehölze entfernt werden.

Pflegemaßnahmen sind soweit genehmigt oder genehmigungsfrei in moderatem Umfang möglich.

Bei Fäll- und Schnittmaßnahmen dürfen Brut- oder Lebensstätten weder beeinträchtigt noch zerstört werden.

Auf das Bundesnaturschutz- sowie das Berliner Naturschutzgesetz in ihren jeweils geltenden Fassungen wird hingewiesen.

Hecken auf und an der Parzelle sind grundsätzlich ganzjährig auf eine Höhe von 1,25 m zu halten.

Begründung wenn Faktor über 100 %

Berlin, den 20.10.2026 Wertermittler: Bert Bauer /

Skizze – Baulichkeiten

Kleingartenanlage:	**KGA Testgarten**	**Parzelle:**	**42**
Parzellenfläche lt. Vertrag:	**380 m²**		**Rosenweg**
Name des Unterpächters:	**Erika Musterfrau**		

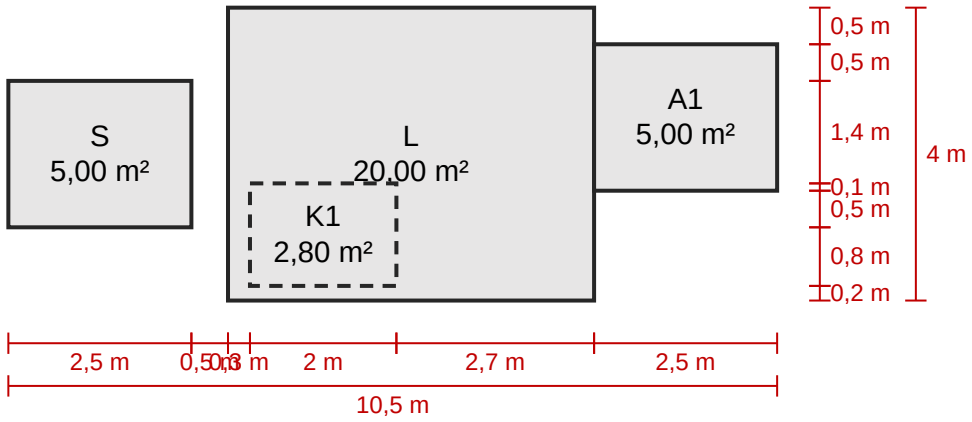

Massenberechnung (Außenmaße, Kubatur nach Dachform)

L · 5 × 4 m = 20,00 m² · Satteldach Traufe 2,4 / First 3,2 m · 56,00 m³
A1 · 2,5 × 2 m = 5,00 m² · Flachdach 2,2 m · 11,00 m³
S · 2,5 × 2 m = 5,00 m² · Pultdach 2,1 / 2,5 m · 11,50 m³
K1 · 2 × 1,4 m = 2,80 m² · Höhe fehlt
Summe: 32,80 m² · 78,50 m³

Berlin, den 20.10.2026 Wertermittler: Bert Bauer

Abkürzungen

Vertrag:

UP	**Unterpächter**
UPV	**Unterpachtvertrag**
BV	**Bezirksverband (hier Gartenfreunde Pankow e.V.)**
Gfrd.	**Gartenfreund**
Gfrdn	**Gartenfreundin**
Gfrde	**Gartenfreunde**
KleingN	**Kleingärtnerische Nutzung im Sinne der Gartenordnung**
RiLW	**Richtlinie zur Wertermittlung von Kleingartenparzellen (hier des Landesverbandes Berlin)**
PW	**Pächterwechsel**

Baulichkeiten, Baumaterialien und Außenanlagen:

A	**Anbau (A1 = Anbau 1; A2 = Anbau 2 usw.)**
ASG	**Abwassersammelgrube**
BG	**Baugenehmigung**
EA	**Elektroanschluss**
EZ	**Elektrozähler**
FI	**Fehlerstrom**
FOK	**Fußbodenoberkante**
GFP	**Glasfaserverstärktes Polyester**
GWH	**Gewächshaus**
HW	**Hauswasseranlage**
KST	**Kunststoff**
L	**Laube**
LB	**Leichtbau**
LVP / ÜVP	**Laubenvorplatz / überdachter Laubenvorplatz**
mH	**mittlere Höhe**
NHK	**Normalherstellungskosten**
RH	**Rankhilfe**
S	**Schuppen**
Si	**Sicherungen (elektrische)**
TB	**Trockenbau**
U / T	**Unterstand / Toilettenhaus**
verz.	**verzinkt**
VHS	**Vorhängeschloß**
WA	**Wasseranschluss**
WMG	**Wassermessgrube**
WZ	**Wasserzähler**
WZS	**Wasserzapfstelle**
zul.	**zulässig (im Sinne der Richtlinien)**
	Bauklasse "U" ist keine Bauklasse im Sinne der Baubewertung. Sie gibt nur an, dass es sich um eine überdachte Fläche handelt.
